ID		Task Name	Duration	S	Fir	Predecessors	Resource Names
1		**Zieldefinition**	**3 days?**	**#**	**##**		
2		Problemstellung	1 day?	#	##		Kunde
3		Grobe Problemanalyse	1 day?	#	##	2	Kunde;Verkäufer
4		Grober Zeitplan	1 day?	#	##	3	Verkäufer
5		Angebot	0 days	#	##	1	Verkäufer
6		Auftrag	0 days	#	##	5	Kunde
7		**Anforderungsanalyse**	**4 days?**	**#**	**##**	**6**	
8		Detailproduktbeschreibung	0,5 days?	#	##		Projekleiter;Designer
9		Abstimmung Produktbeschreibung	0 days	#	##	8	Projekleiter;Kunde
10		Produktbeschreibung anpassen	1 day?	#	##	9	Projekleiter
11		Kundennetzwerkdaten erheben	0,5 days?	#	##	10	Designer;Techniker
12		Kunden IT-Landschaft erhaben	0,5 days?	#	##	11	Designer;Techniker
13		Kennzahlen	0,5 days?	#	##	12	Designer;Techniker
14		Qualitäts-/Abnahmekriterien	1 day?	#	##	13	Projekleiter;Kunde
15		Anforderung OK	0 days	#	##	7	Projekleiter;Kunde
16		**Design**	**2,5 days?**	**#**	**##**	**15**	
17		Use Cases	1 day?	#	##		Designer
18		Modulabgrenzungen	0,5 days?	#	##	17	Designer;Techniker
19		Klassendiagramme	1 day?	#	##	18	Designer
20		ER-Modelle	1 day?	#	##	18	Designer
21		GUI Anforderung	1 day?	#	##	17	Designer;Kunde
22		Schittstellendefinitionen	1 day?	#	##	18	Techniker;Designer
23		Entwicklungsumgebung festlegen	1 day?	#	##		Techniker;Designer
24		Hardware festlegen	1 day?	#	##		Designer;Techniker
25		Design fixieren	0 days	#	##	16	Projektleiter;Kunde
26		**Umsetzung**	**2 days?**	**#**	**##**	**25**	
27		Hardware einkaufen	1 day?	#	##		Kunde
28		Module auf Entwickler aufteilen	1 day?	#	##		Projektleiter;Programm
29		Module Programmieren	1 day?	#	##	28	Programmierer
30		Entwicklung V1 abgeschlossen	0 days	#	##	26	Projektleiter;Programm
31		**Testen**	**4 days?**	**#**	**##**	**30**	
32		Interaktion der Module	1 day?	#	##		Programmierer
33		Echtdaten in künstl. Umgebung	1 day?	#	##	32	Programmierer;Techni
34		Ergebnisauswertung	1 day?	#	##	33	Techniker
35		Fehlerkorrektur	1 day?	#	##	34	Programmierer;Techni
36		Test erfolgreich	0 days	#	##	31	Projektleiter;Techniker
37		**Rollout**	**7 days?**	**#**	**##**	**36**	
38		Hardware installieren	1 day?	#	##		Techniker
39		Schulung	1 day?	#	##	38	Trainer
40		Sicherung Altsystem	1 day?	#	##		Kunde;Techniker
41		Installation im Kundennetzwerk	1 day?	#	##	38	Kunde;Techniker
42		Altdatenübernahme	1 day?	#	##	41	Techniker
43		Parallelbetrieb	1 day?	#	##	42	Techniker
44		Datenvergleich mit Altsystem	1 day?	#	##	43	Techniker
45		Fehlerkorrektur	1 day?	#	##	44	Programmierer;Techni
46		Datenvergleich mit Altsystem	1 day?	#	##	45	Techniker
47		Systemeinsatz	0 days	#	##	37	
48		Planung Release 2	0 days	#	##	47	Kunde;Verkäufer

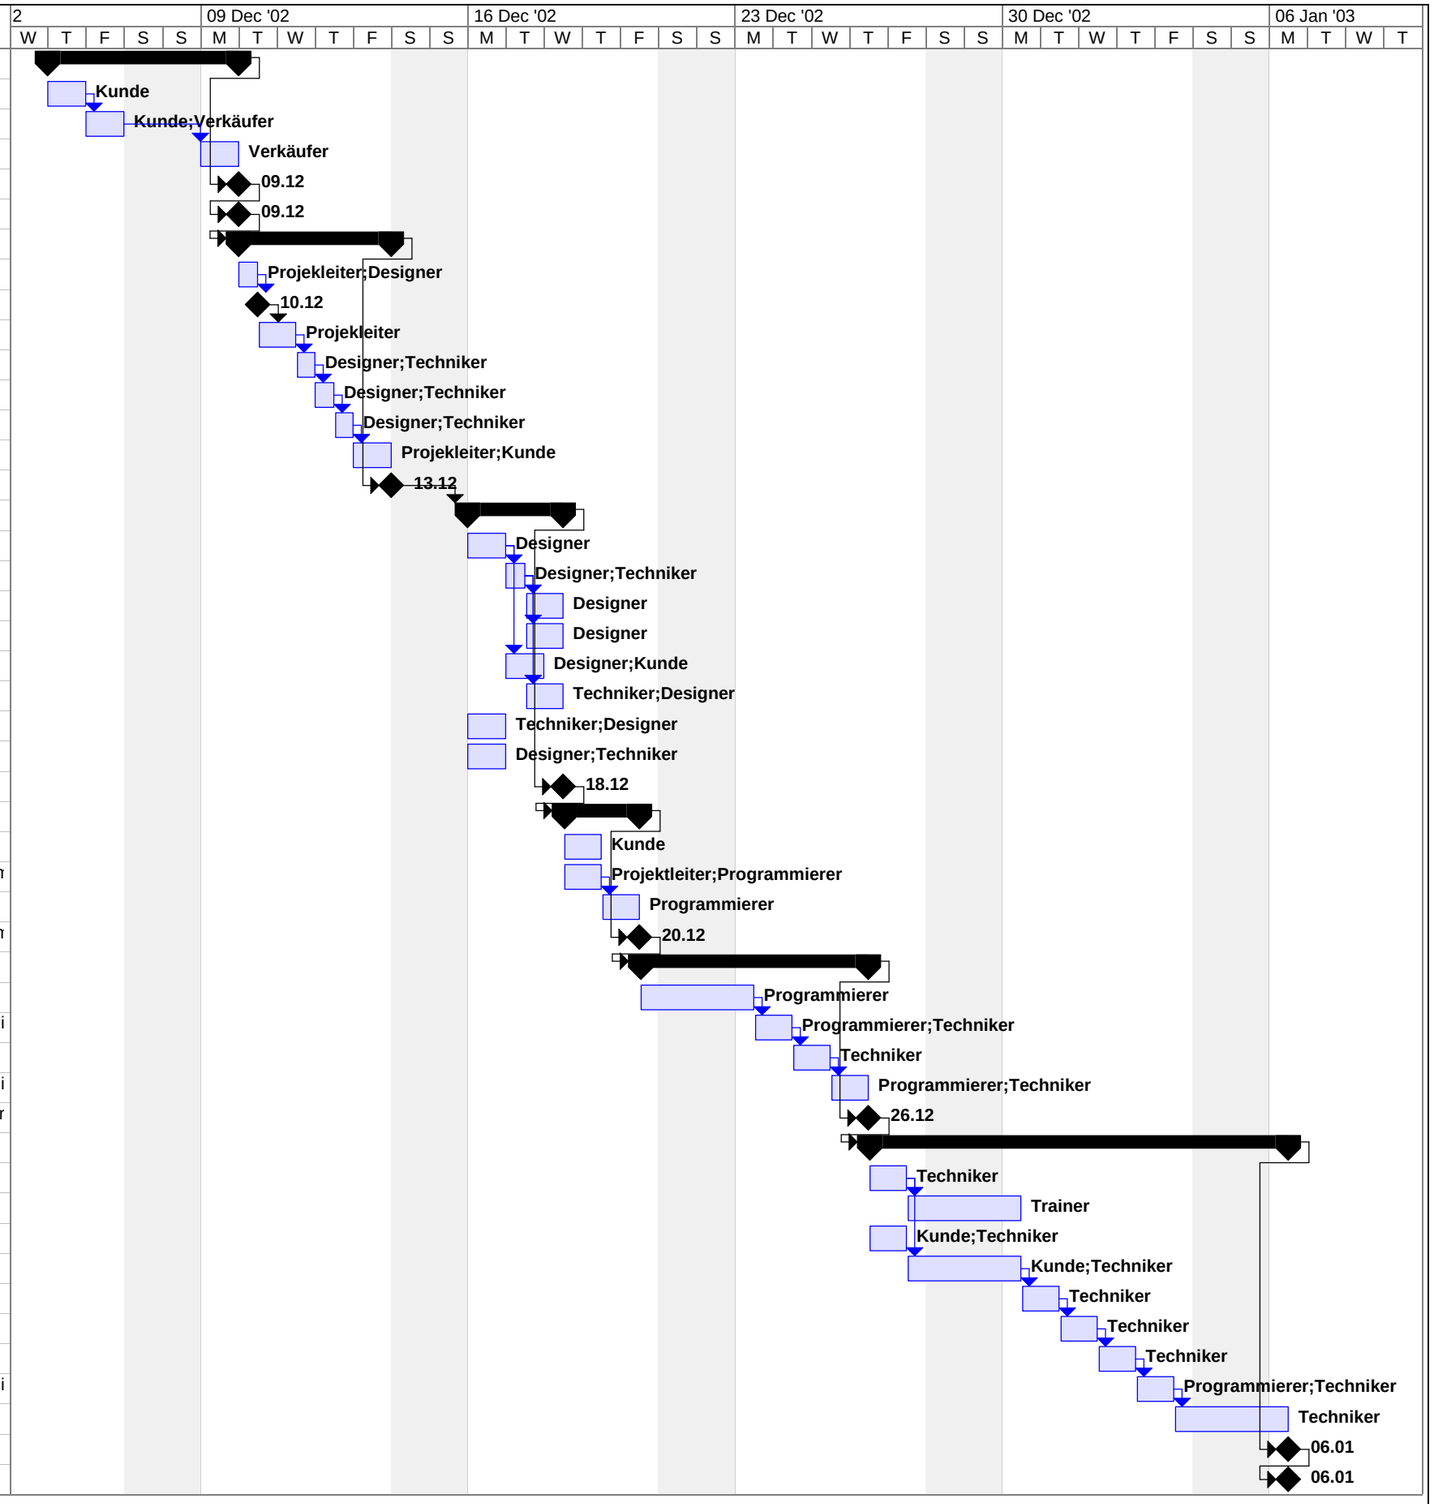

Project: aufgabe2b
Date: Thu 05.12.02

Task		Progress		Summary		External Tasks		Deadline	
Split		Milestone		Project Summary		External Milestone			
